


秀禅川河川改修工事かわら版 第5号

河川改修工事の進捗について

山田町では、前号で令和4年8月完了予定として延伸をお知らせしたところですが、秀全堂付近の河川を横断する下水道設計の見直しなどにより、一部の施工区間において完成時期の延伸が必要となりましたので、改めて進捗状況等についてお知らせします。

工事に伴う騒音や、交通規制等で大変ご迷惑をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

延伸後の工事完了予定時期は赤で表示

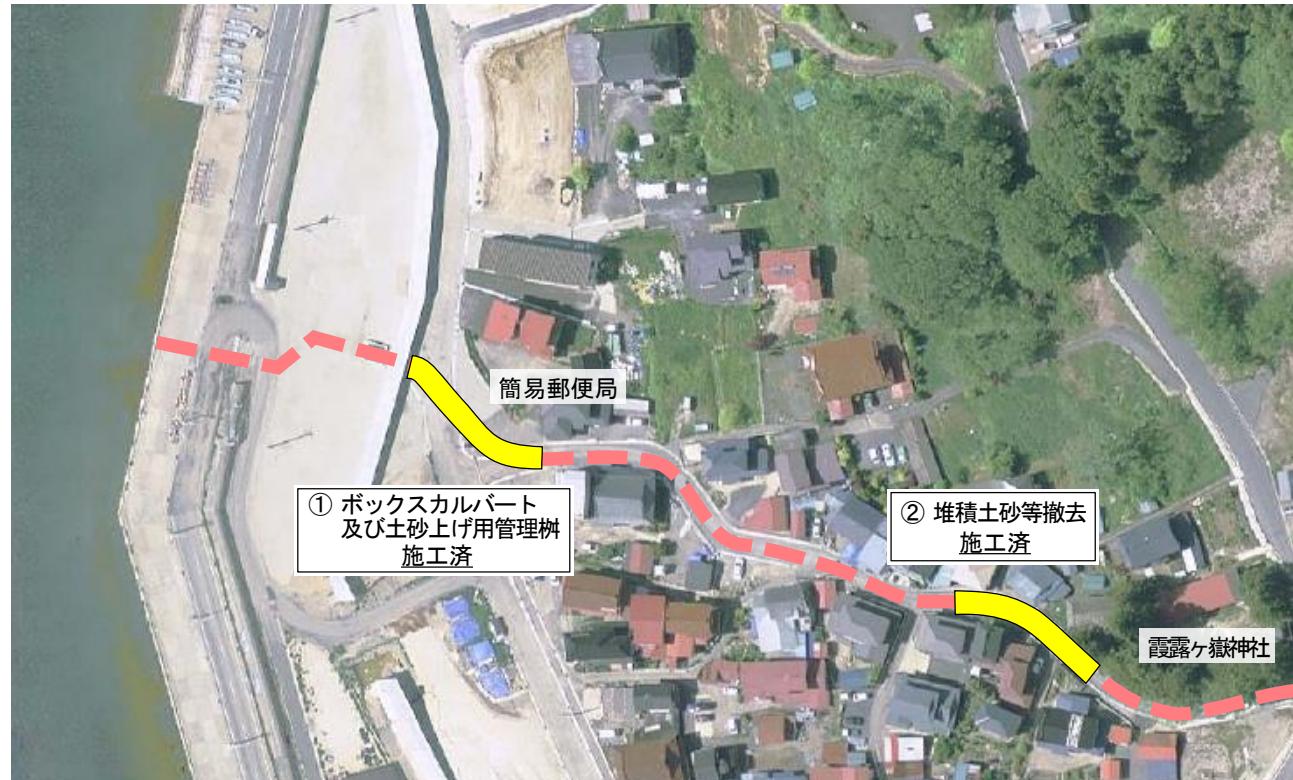

③ 開渠：コンクリートブロック護岸 施工中

令和4年9月完了予定



③ 暗渠：ボックスカルバート 施工済
※ボックスカルバート上部に河川横断下水道管を設置し、道路を復旧して完成

令和4年10月完了予定



⑥ 町道アスファルト舗装復旧

令和4年11月完了予定

仮設道路
※河川改修工事完了後に撤去

凡例（準用河川秀禅川）		
施工箇所	開渠（地上水路）	
	暗渠（地下水路）	
	開渠（地上水路）	
	暗渠（地下水路）	

※ボックスカルバートとは
地中に埋設される箱型のコンクリート水路のことをいいます。

【問い合わせ先】
山田町建設課建設復旧チーム TEL：0193-82-3111（内線237）
工事請負者：株式会社カネナカ TEL：0193-25-0500
