

田の浜地区復旧整備工事 かわら版

第5号

発行・編集 山田町建設課

田の浜地区復旧整備工事の進捗について

岩手県及び山田町では、令和2年6月に策定した田の浜地区復旧整備計画に基づいて整備工事を進めておりますが、一部の工事において完成時期が延伸することとなりました。復旧整備工事の完成時期及び進捗等についてお知らせします。


延伸後の工事完成予定時期は赤で表示

● 準用河川女川

- ① 災害復旧（護岸の洗掘箇所を復旧）
 - ② 河川改修（田の浜コミュニティセンター付近）
開渠区間は自然護岸をブロック積み護岸に改修
 - ③ 河川改修（住宅地周辺～防災緑地公園）
暗渠区間（トンネル河川）は既往最大雨量に対応したボックスカルバートに改修
 - ④ 河川改修（低地部）
防災緑地公園下から水門までの区間は、一部を除き開渠に改修
 - ⑤ 船越漁港海岸災害復旧（県施工）
既往最大雨量に対応した流末に改修（水門整備含む）
工事請負者：大坂建設株式会社
令和4年9月完成予定
- 工事請負者 三好建設株式会社
令和4年3月完成予定
令和4年10月完成予定
令和4年7月完成予定

● 防災緑地公園

- ⑥ 災害復旧（盛土の損壊箇所を復旧）
工事請負者：三好建設株式会社
令和4年3月完成予定
- ⑦ 改良整備（避難路兼用開口部を整備し、排水機能と津波防御機能を強化）
・公園改良
工事請負者：三好建設株式会社
令和4年3月完成予定
・陸閘整備
工事請負者：㈱中央コーポレーション
令和4年3月完成予定

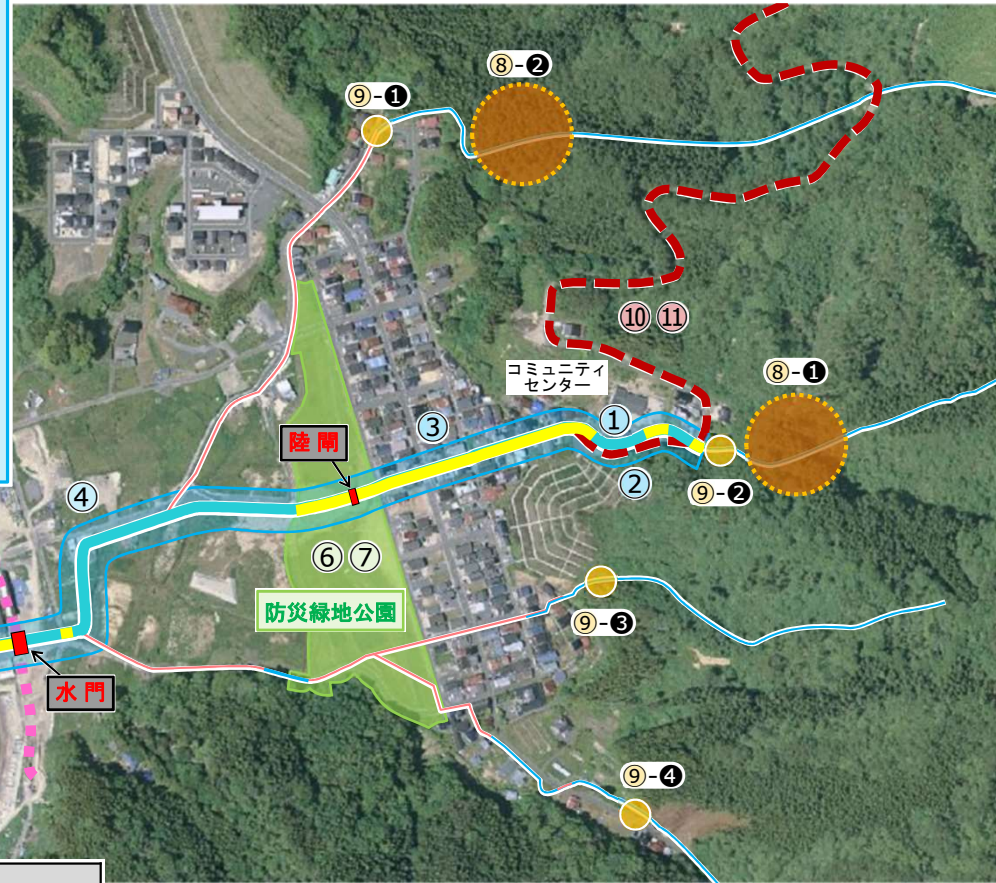

● 田ノ浜沢


- ⑧ 砂防堰堤整備（県施工）：2か所
① 工事請負者：長沢産業株式会社
令和5年度完成予定
② 工事請負者：㈱タカヤ
令和5年度完成予定
- ⑨ 土砂等流入防止対策（スクリーン（※1）設置等）：4か所
①② 県砂防堰堤整備工事との調整により、
令和5年度施工予定
③④ 工事請負業者：㈱港建設
令和4年3月完成予定

（※1）スクリーンとは
鉄格子状のもので、土砂や流木等が水路内に流入するのを防ぐため設ける施設のことをいいます。

● 町道田の浜・小谷鳥線

- ⑩ 災害復旧（路面洗掘された箇所の復旧）
・山間部 工事請負者：富山建設株式会社
令和2年6月完成済
・田の浜コミュニティセンター付近
工事請負者：三好建設株式会社
令和4年10月完成予定
- ⑪ 改良整備（路面洗掘防止のための路面排水ゴム板（※2）を田の浜～小谷鳥区間16箇所に設置）
工事請負者：㈱阿部興業
令和4年1月完成済

（※2）路面排水ゴム板



凡 例		施 工 箇 所	
開 渠		施 工 箇 所	砂 防 堰 堤
暗 渠			スクリーン設置等
準用河川女川			開 渠（沢）
町道田の浜・小谷鳥線			暗 渠（沢）
防 潮 堤			

【砂防工事に関する問い合わせ先】
宮古土木センター河川港湾課 TEL：0193-65-0031

【船越漁港海岸工事に関する問い合わせ先】
宮古水産振興センター漁港復旧課 TEL：0193-64-2216

【町発注工事に関する問い合わせ先】
山田町建設課建設復旧チーム TEL：0193-82-3111(内線234)

主な事業の整備状況

準用河川女川

船越漁港海岸災害復旧（県施工）
令和4年9月完成予定

今後の主な予定は、水門上・下流の集水樹の施工及び水門下流部のボックスカルバート（L=50.0m）の設置を行います。

船越漁港海岸6号水門



(R4. 1. 25撮影)


河川改修（住宅地周辺）
令和4年10月完成予定



(R3. 12. 27撮影)

防災緑地公園

陸間整備：令和4年3月完成予定

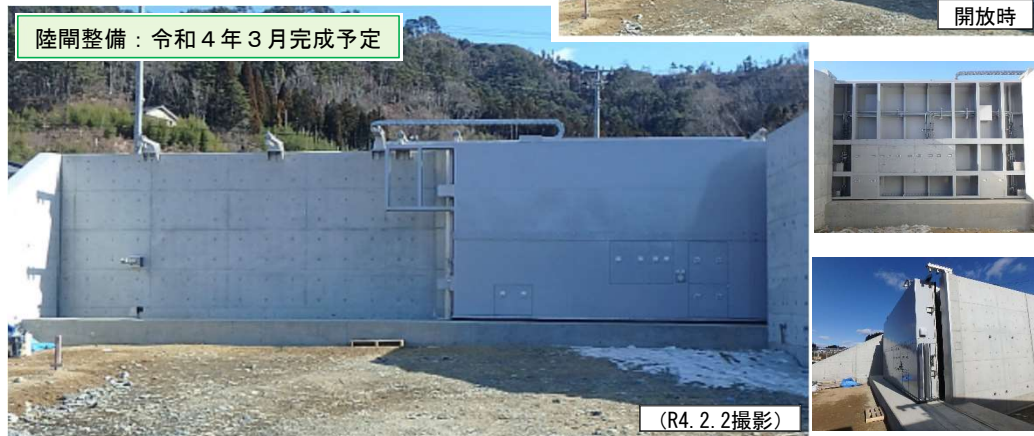

(R4. 2. 2撮影)

砂防堰堤の整備（準用河川女川上流）

⑧-① 砂防堰堤整備（県施工）長沢産業(株)請負工区：令和5年度完成予定

令和4年1月末現在、堤高10.5mに対して、およそ7.5mの高さまでコンクリート打設が終わっています。



(R4. 1. 26撮影)



砂防堰堤の整備（新開地地区の沢上流）

⑧-② 砂防堰堤整備（県施工）(株)タカヤ請負工区：令和5年度完成予定

令和4年1月末現在、堤高11.0mに対して、およそ7.0mの高さまでコンクリート打設が終わっています。



(R4. 1. 26撮影)



町道田の浜・小谷鳥線の改良

路面排水ゴム板設置：令和4年1月完成済



(R4. 2. 2撮影)

田ノ浜沢土砂等流入防止対策

スクリーン設置：令和4年3月完成予定



(R4. 2. 2撮影)
